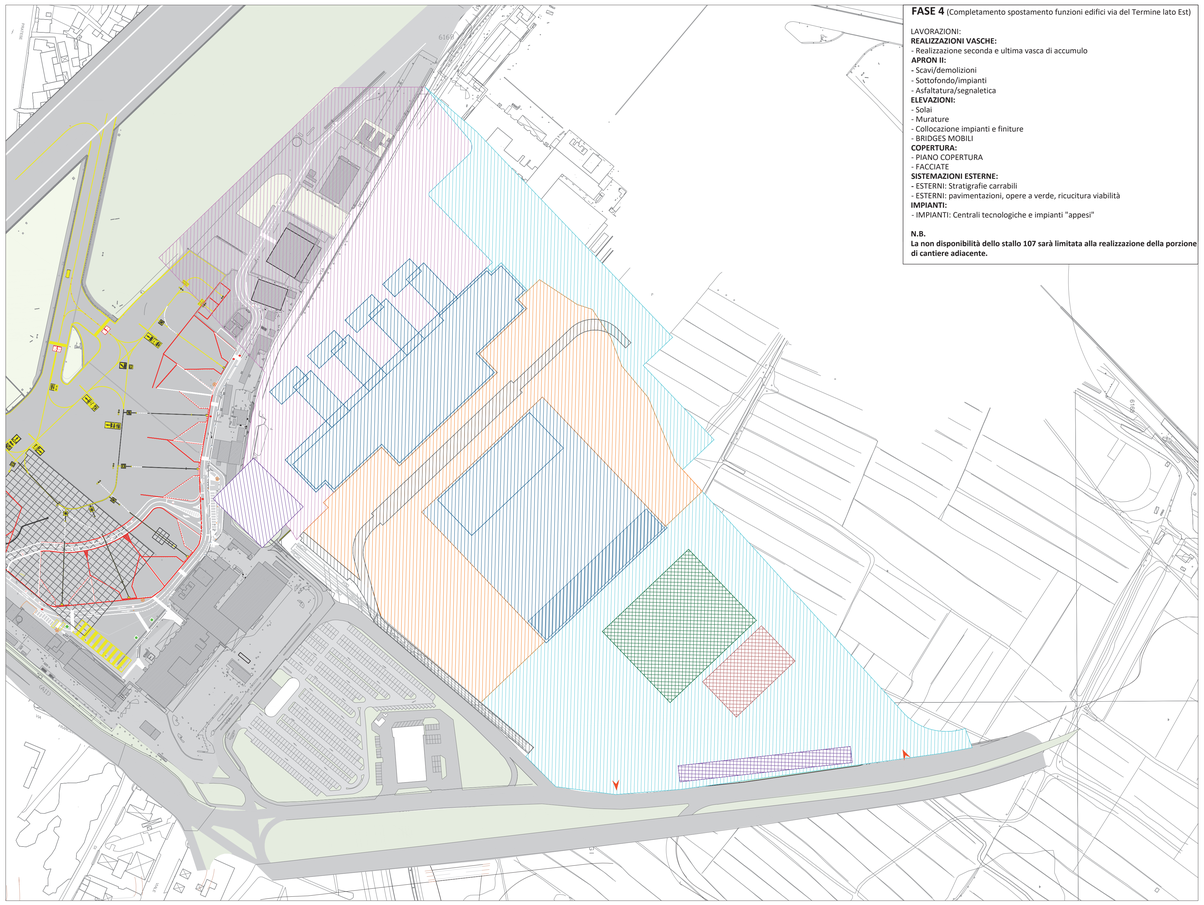

FASE 4 (Completamento spostamento funzioni edifici via del Termine lato Est)

LAVORAZIONI:
REALIZZAZIONI VASCHE:
- Realizzazione seconda e ultima vasca di accumulo
APRON II:
- Scavi/demolizioni
- Sottofondo/impianti
- Asfaltatura/segnaletica
ELEVAZIONI:
- Solai
- Murature
- Collocazione impianti e finiture
- BRIDGES MOBILI
COPERTURA:
- PIANO COPERTURA
- FACCIATE
SISTEMAZIONI ESTERNE:
- ESTERNI: Stratigrafie carrabili
- ESTERNI: pavimentazioni, opere a verde, ricucitura viabilità
IMPIANTI:
- IMPIANTI: Centrali tecnologiche e impianti "appesi"

N.B.
La non disponibilità dello stallo 107 sarà limitata alla realizzazione della porzione di cantiere adiacente.

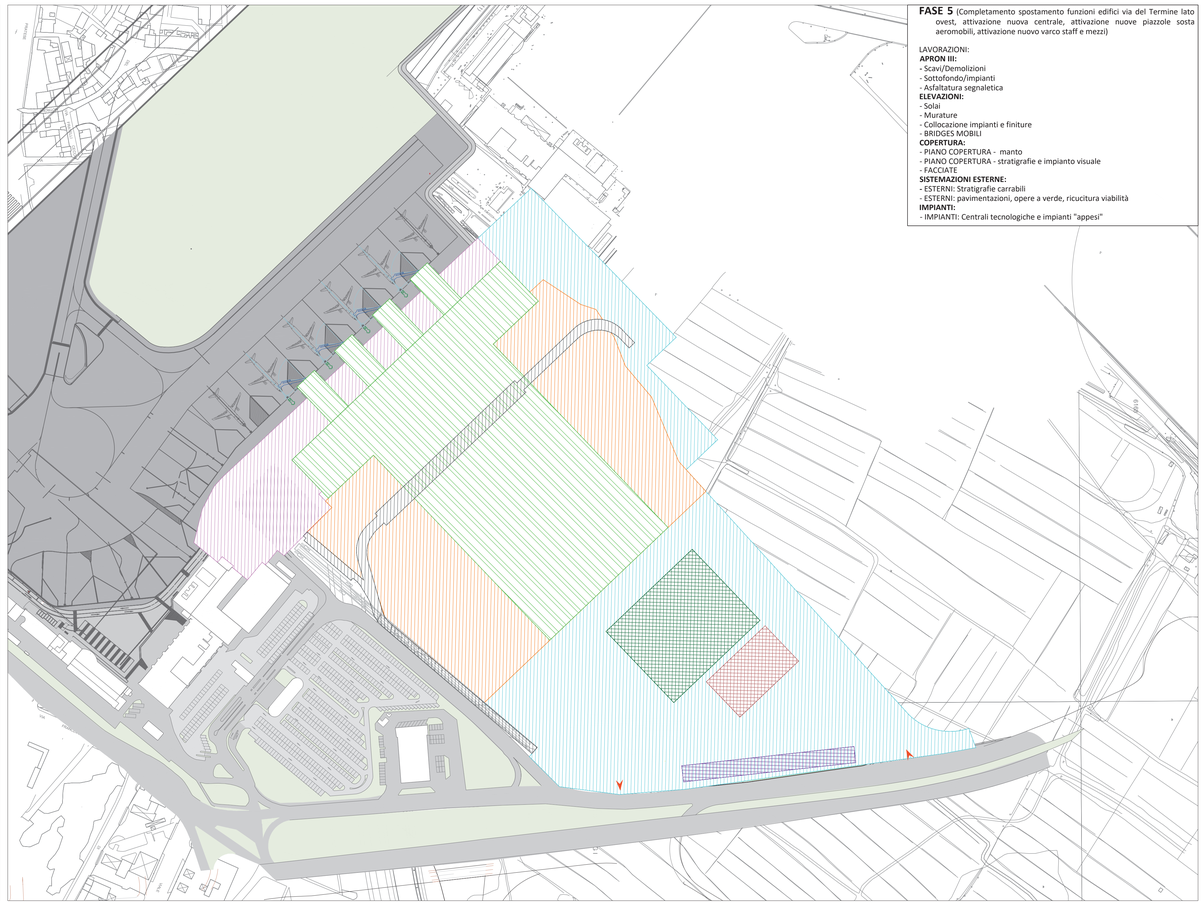

FASE 5 (Completamento spostamento funzioni edifici via del Termine lato ovest, attivazione nuova centrale, attivazione nuove piazzole sosta aeromobili, attivazione nuovo varco staff e mezzi)

LAVORAZIONI:
APRON III:
- Scavi/Demolizioni
- Sottofondo/impianti
- Asfaltatura segnaletica
ELEVAZIONI:
- Solai
- Murature
- Collocazione impianti e finiture
- BRIDGES MOBILI
COPERTURA:
- PIANO COPERTURA - manto
- PIANO COPERTURA - stratigrafie e impianto visuale
- FACCIATE
SISTEMAZIONI ESTERNE:
- ESTERNI: Stratigrafie carrabili
- ESTERNI: pavimentazioni, opere a verde, ricucitura viabilità
IMPIANTI:
- IMPIANTI: Centrali tecnologiche e impianti "appesi"

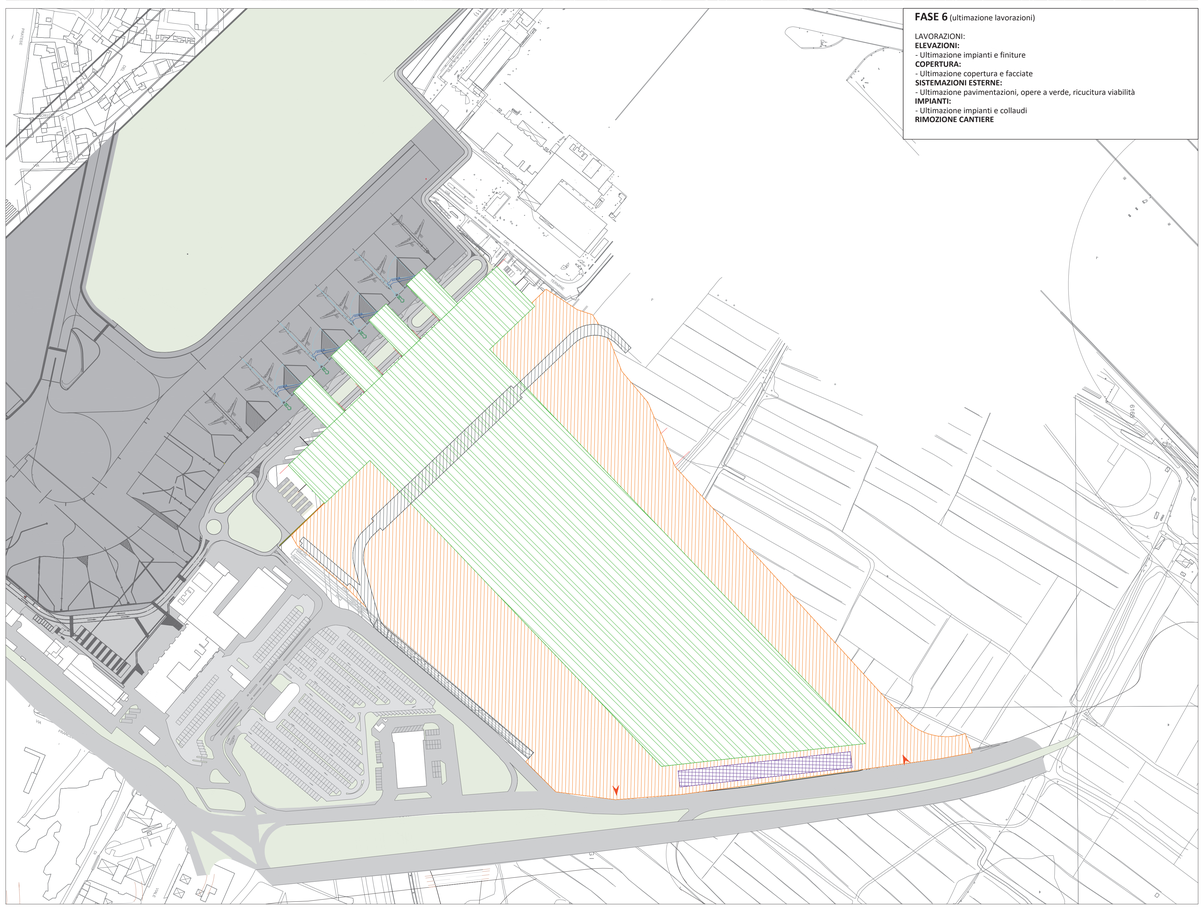

FASE 6 (ultimazione lavorazioni)

LAVORAZIONI:
ELEVAZIONI:
- Ultimazione impianti e finiture
COPERTURA:
- Ultimazione copertura e facciate
SISTEMAZIONI ESTERNE:
- Ultimazione pavimentazioni, opere a verde, ricucitura viabilità
IMPIANTI:
- Ultimazione impianti e collaudi
RIMOZIONE CANTIERE

KEYPLAN



LEGENDA

- Ingresso/uscita di cantiere
- Recinzione cantiere
- Recinzione aeroportuale
- Aree di cantiere
- Aree di indagine
- Area logistica cantiere
- Area di stoccaggio e prefabbricazione
- Depositi temporanei
- Aree di lavorazione (scavi, vasche e fondazioni)
- Aree di lavorazione (strutture in elevazione e copertura)
- Cantiere tram
- Aree di lavorazione (Apron parte)

NOTE

REVISIONI

REV	DATA	DESCRIZIONE
00		
01		
02		
03		
04		
05		
06		

Data di emissione	06/2022
Revisione	00
Fase	PF
Scala	1:2000
REDATTO	
CONSULTO	
VERIFICATO	
V. CONTI	
APPROVATO	Ing. Lorenzo Ferrone
Codice file	Plan Cantieriz_02
Tipo file	F.to A1
Nome File	F.to A1 T.C.S.Pr.00-02_Plan Cantieriz 02

Ente di riferimento
AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE "AMERIGO VESPUCCI"

Opera
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE TERMINALI

Titolo Elaborato
PLANIMETRIA 02 FASI DI CANTIERIZZAZIONE

Fase di Progetto
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

E.N.A.C. ENTE NAZIONALE per L'AVIAZIONE CIVILE

COMMITTENTE PRINCIPALE
Toscana Aeroporti
ACCOUNTABLE MANAGER
Dott. Vincenzo Ceccarelli

SUPPORTO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
ACI ENGINEERING S.A.
RAFAEL VIÑOLY ARCHITECTS PC

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Claudio Rosini

POST HOLDER PROGETTAZIONE
Ing. Francesco Agostini Bonatesta

POST HOLDER MANUTENZIONE
Ing. Nicolino D'Aquilio

POST HOLDER AREA DI MOVIMENTO
Dott. Luca Ferro

SUPPORTO TECNICO ENTE AERONAUTICO
Eckersley O'Callaghan

SUPPORTO GEOTECNICO
TEKNE

SUPPORTO GEOTECNICO
me engineer

SUPPORTO GEOTECNICO
TECNOSCAN S.r.l.

Toscana Aeroporti MOBILITÀ
DIRETTORE TECNICO
Ing. Andrea Bartolomei

SUPPORTO SPECIALISTICO GENERALE
HYDROGEO

SUPPORTO PROGETTO APRON
ACA

SUPPORTO SPECIALISTICO
PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE
Dottor Ing. Paolo Ricci
Dottor Ing. Luca Ricci
Dottor Ing. Lorenzo Ricci

PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E STRUTTURE
Dottor Ing. Paolo Ricci
Dottor Ing. Lorenzo Ricci

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI NON STRADALI
Dottor Ing. Paolo Ricci
Dottor Ing. Lorenzo Ricci

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Dottor Ing. Paolo Ricci
Dottor Ing. Lorenzo Ricci

PROGETTAZIONE IMPIANTI OPERE ELETTROMECCANICHE
Dottor Ing. Paolo Ricci
Dottor Ing. Lorenzo Ricci

GEOLOGIA
TRE-A ERRE S.r.l.

ARCHEOLOGIA
ARS

SUPPORTO GEOTECNICO
TECNOSCAN

SUPPORTO GEOTECNICO
LAV. GEOTECNICI E PROVE IN SITO

E' DEFINITIVAMENTE VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, E L'USO PER UTILIZZI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLA COMMITTENTE
